

**ЭРЧИМ ХУЧНИЙ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН
АЖЛЫН ТАЙЛАН № 1**

ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ НЭР: БАГАНУУР ҮЙЛДВЭР ТЕХНИОЛОГИЙН
ПАРКИЙН ЕРӨНХИЙ ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ (УЛААНБААТАР
ХОТ, БАГАНУУР ДҮҮРЭГ) 110КВ-ЫН ЦДАШ

Захиалагч: **НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГИЙН ГАЗАР**

**Захиалагчийн
хяналт гүйцэтгэгч:** **НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР**


Гүйцэтгэгч: **“ЭНХ-ӨГЛӨӨ” ХХК**

Зургийн зохиогч: **“МОН ЭНЕРЖИ КОНСАЛТ” ХХК**

Гэрээний дугаар: НХААГ/202212173

Гэрээний хугацаа: 2022/09/05-ны өдрөөс 2023/08/30 өдөр

Гэрээний үнэ: 2,174,099,435.00 төгрөг

Тайлан гаргасан: “Энх Өглөө” ХХК-ийн инженер.....М.Мөнхтөр

АГУУЛГА

1. Гүйцэтгэлийн хураангуй тайлан

- 1.1 Долоо хоногийн товч хураангуй /явц/
- 1.2 Ажиллах хүчин, ХАБЭА-н зааварчилгаа өгсөн байдал
- 1.3 Гол хийгдсэн ажлууд
- 1.4 Ирэх 7 хоног хийхээр төлөвлөсөн ажлууд
- 1.5 Гол ажлуудыг төлөвлөсөн боловч биелээгүй

2. Гол онцлох зүйлс /тулгамдаж байгаа болон шийдвэрлүүлэх асуудал/

3. Санхүүжилттэй холбоотой асуудал /санхүүжилтийн

4. ТӨСЛИЙН НЭГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛ


- 4.1 Зураг төсөл инженеринг боловсруулалт /өөрчлөлт орсон эсэх үгүй/%
- 4.2 Үйлдвэрлэл /тоног төхөөрөмжийн/ %
- 4.3 Тээвэрлэлт, нийлүүлэлт, 38%
- 4.4 Ажлын талбайн угсралт суурилуулалт, %
- 4.5 Туршилт тохируулга хийсэн байдал, %
- 4.6 Бичиг баримтын бүрдэл, ил далд ажлын акт%

5. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

6. Ажлын явцын зурган тайлан

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН			
Огноо	Тайлангийн дугаар	Хуудасны тоо	Хавсралт материалын тоо
2022/10/31	1	4	13
1. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙ ТАЙЛАН			
1.1 Долоо хоногийн товч хураангуй /явц/	Багануур үйлдвэр технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг) 110кВ-ын ЦДАШ		
1.2 Ажиллах хүчин /нийт/:14, Үүнээс: - ИТА-1 - Монтёр-3 - Автокранист - Гагнуурчин-1 - Операторчин-1 - Туслах ажилчин-3 - Тээврийн жолооч-2 - Тогооч-1 ХАБЭА-н зааварчилгаа өгсөн байдал:	<ul style="list-style-type: none"> • Багануур үйлдвэр технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг) 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажил хийгдэж байна. • Ажлын талбайд ХАБЭА-ны зааварчилгааг ажилд гарсан өдөр бүрийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зааварчилгааны дэвтэрт тэмдэглэж гарын үсэг зуруулж ХАБЭА инженер Б.Нармандах баталгаажуулж байна. • Төслийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа ИТА, машин махенизм мөн байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгал, гэнтийн ослын даатгалаар даатгуулсан. 		
1.3 Гол хийгдсэн ажлууд	<p>110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажил:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022 оны 10-р сарын 13 ний өдөр ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарснаар Багануур үйлдвэр технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг) 110кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажлыг эхлүүлсэн. • 2022 оны 10-р сарын 14 ний өдөр 110кВ-ын ЦДАШ-ын тэг тэнхлэг газар дээр байгуулж актаар баталгаажуулсан. • Төслийн ажилд шаардлагатай төмөр тулгуурын суурь Ф3-2, Ф3-А, Ф5-А үйлдвэрлэж дуусгасан. • 18 ширхэг төмөр тулгуурын суурийн нүх ухах ажил хийгдсэн. • Төмөр тулгуурын суурийн доор нягтруулга хийх 0,5мм хайрга 90м³ ийг трассын дагуу буулгасан. • Ф3-2 төмөр тулгуурын суурь 16 ш, Ф5-А маягийн суурь 4 ширхэгийг суурилуулсан. <p>Тээвэр:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Төмөр тулгуурын Ф3-2 маягийн суурь 24 ширхэгийг трассын дагуу буулгасан. • Төмөр тулгуурын Ф5-А маягийн суурь 28 ширхэгийг трассын дагуу буулгасан. • Төмөр тулгуурын суурийн бэхэлгээний Р1-А маягийн чагт 28 ширхэг трассын дагуу буулгасан тээвэрлэлтын ажил үргэлжилж байна. 		
1.4 Ирэх 7 хоног хийхээр төлөвлөсөн ажлууд	Төмөр тулгуурын суурь суурилуулах, Ф5-А суурь тээвэрлэх,		
1.5 Гол ажлуудыг төлөвлөсөн боловч биелээгүй	Байхгүй,		
2. ГОЛ ОНЦЛОХ ЗҮЙЛС /ТУЛГАМДАЖ БАЙГАА АСУУДАЛ/			
2.1	Байхгүй,		
3. САНХҮҮЖИЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДАЛ,			

3.1			
4. ТӨСЛИЙН НЭГДСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛ			
Ангилал	Төсөвт өртөт эзлэх хувь	Бодит гүйцэтгэл	/%/
4.1 Үйлдвэрлэл /тоног төхөөрөмжийн/	00	00	00
4.2 Тээвэрлэлт, нийлүүлэлт	38	38	38
4.3 Ажлын талбайн угсралт суурилуулалт	10	10	10
4.4 Туршилт тохируулга хийсэн байдал	00	00	00
4.5 Бичиг баримтын бүрдэл, ил далд ажлын акт	5	5	5
5. ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ			
5.1	Төмөр тулгуурын суурь суурилуулах, тээврийн ажлыг үргэлжлүүлэх		



НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР



БАРИЛГЫН АЖЛЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар

/Аймаг, хотын нэр/

2022/10/13

0011928 817/2022

/Зөвшөөрөл олгосон огноо/

/Зөвшөөрлийн дугаар/

1. Барилга байгууламжийн байршлын талаарх мэдээлэл:

Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Багануур сум /дүүрэг/, баг /хороо/,
гудамж /хороолол/;

2. Газрын эрхийн бүртгэлийн мэдээлэл:

Иргэний хувьд: харьяалал /аль улсын/ нэр,
овог, эцэг /эх/-ийн нэр, оноосон нэр,
Хуулийн этгээдийн хувьд: улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, газрын эрхийн
хэлбэр (өмчлөх, эзэмших, ашиглах), газрын
зориулалт, талбайн хэмжээ, газар эзэмших, ашиглах хугацаа, кадастрын код;

3. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа:

2023.08.30 барилгын ажил гүйцэтгэх графикт хугацаа;

4. Барилга байгууламжийн талаарх мэдээлэл:

Эрчим хүчний барилга байгууламж зориулалт, 25000кВА, 110кВ-ын АШ,
110/35/10кВ-ын дэд станц
хүчин чадал, Цахилгаан үндсэн хийц,
хэмжээ, давхрын тоо, хэсэг /блок/, МЭК-01/18 зураг төслийн
шифр дугаар;

5. Барилга байгууламжийн ангилал: Дунд төвөгшилтэй барилга байгууламж;

6. Барилгын ажлын захиалагчийн талаарх мэдээлэл:

Иргэний хувьд: харьяалал /аль улсын/ нэр,
овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр

Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум /дүүрэг/ баг /хороо/,
..... гудамж /хороолол/ байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар,
..... холбоо барих утас, цахим хаяг;

Хуулийн этгээдийн хувьд: **Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар** оноосон нэр,
..... улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум /дүүрэг/ баг /хороо/,
..... гудамж /хороолол/ байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар,
..... холбоо барих утас, цахим хаяг;

7. Барилгын зураг төсөл зохиогчийн талаарх мэдээлэл:

"Мон-Энержи консалт" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр,
2790017 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **ЗТ19-1116/19,**.....
ЗТ-29/21

зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: **Улаанбаатар** аймаг /нийслэл/, **Чингэлтэй** сум /дүүрэг/ **3-р** баг /хороо/,
40 мянгат гудамж /хороолол/ **19-11 тоот** байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар,
9916-9955 холбоо барих утас, цахим хаяг;

8. Барилгын ажил гүйцэтгэгчийн талаарх мэдээлэл:

"Энх-Өглөө" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр,
5207886 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **846/21**.....

барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: **Улаанбаатар** аймаг /нийслэл/, **Сүхбаатар** сум /дүүрэг/ **4-р** баг /хороо/,
..... гудамж /хороолол/ **44-15 тоот** байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар,
9900-5400 холбоо барих утас, цахим хаяг;

9. Онцгойлон заах нөхцөл:

Санамж: Барилгын талбайд болон засмал зам руу нийлэх хэсэгт тээврийн хэрэгслийн дугуйг тусгайлан бэлтгэсэн зориулалтын талбайд цэвэрлэж байх.

Инженерийн бэлтгэл ажил, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны норм дүрмийг чанд сахиж ажиллах.


Барилгын талбайн түр хашаа MNS5414:2014; Хамгаалах хашлага MNS.12.4.007:1981 стандартуудыг дагаж мөрдөх, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

10. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгосон албан тушаалтны мэдээлэл:

Хот байгуулалт, хөгжлийн газар байгууллагын нэр,

Хот байгуулалтын инженерийн албан тушаал **М.Идэрбаатар** овог нэр,
бэлтгэл, хяналтын хэлтсийн дарга

/ гарын үсэг, (тамга, тэмдэг).



ДААТГАЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ
ОЛГОСОН ӨДӨР
2022/10/05
ДААТГАГЧ

БОДЬ ДААТГАЛ ХК
 400 тоот, Бодь Цамхаг, Ц.Жигжиджавын гудамж,
 Улаанбаатар -15160, Монгол Улс
 Утас: +976 70110280 Факс: +976 11326535
 E-mail: info@bodi-insurance.com
 Web: www.bodi-insurance.com

ЭНЭХҮҮ ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ ЗӨВХӨН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ ЗОРИЛГООР ОЛГОГДСОН БӨГӨӨД ДОР ДУРЬДАГДСАН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНД ХИЙГДСЭН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙГООС БУСАД ТОХИОЛДОЛД ГЭРЧИЛГЭЭНД ЯМАРВАА НЭГЭН НЭМЭЛТ, СУНГАЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙГДЭХГҮЙ.

ДААТГАЛЫН ЭРХ БҮХИЙ КОМПАНИ
ДААТГУУЛАГЧ

ЭНХ ӨГЛӨӨ ХХК
 Хаяг: 309 тоот, Браухаус байр, 3-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс

ДААТГАЛЫН КОМПАНИ "А"

БОДЬ ДААТГАЛ ХК

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

ДЭЭР ДУРЬДАГДСАН ДААТГУУЛАГЧ НЬ ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦААНД ДАРААХ ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТАНД БҮРЭН ХАМРАГДСАН ГЭДГИЙГ БАТАЛГААЖУУЛЖ БАЙНА. ЭНЭХҮҮ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХТОЙ ХОЛБООТОЙ ЯМАРВАА НЭГЭН ШААРДЛАГА, АЛИВАА НЭГЭН ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ БОЛОН БУСАД БАРИМТ БИЧГИЙГ ҮЛ ХАРГАЛЗАН, ГЭРЧИЛГЭЭНД ДУРЬДАГДСАН ДААТГАЛ НЬ ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭНИЙ БҮХИЙ Л НӨХЦӨЛ, ХАСАЛТ ЗЭРГИЙГ ДАГАН МӨРДӨНӨ.

ДААТГАЛЫН ТӨРӨЛ		ГЭРЭЭНИЙ ДУГААР	ГЭРЭЭ ЭХЛЭХ ОГНОО	ГЭРЭЭ ДУУСАХ ОГНОО	ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ /төгрөг/
А	БАЙГУУЛЛАГЫН ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ	LIA06C22140122	2022/10/05	2023/10/04	400,000,000
Б	ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ	HIA01C22140156	2022/10/05	2023/10/04	129,000,000
В	ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ	ECI06C22140024	2022/10/05	2023/10/04	60,000,000
Г	ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ	ECI01C22140019	2022/10/05	2023/10/04	20,000,000
Д	МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ	PIA05C22140022	2022/10/05	2023/10/04	40,000,000

ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧ
ДААТГУУЛАГЧ

ЭНХ ӨГЛӨӨ ХХК
 Хаяг: 309 тоот, Браухаус байр, 3-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол Улс

ХЭРЭВ ДЭЭР ДУРЬДАГДСАН ДААТГАЛЫН ГЭРЭЭ НЬ ГЭРЭЭ ДУУСАХ ӨДРӨӨС ӨМНӨ ЦУЦЛАГДСАН ТОХИОЛДОЛД ДААТГАЛЫН КОМПАНИ НЬ ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГАД БИЧГЭЭР ХИЙСЭН МЭДЭГДЛИЙГ ХҮРГҮҮЛЭХ БӨГӨӨД УГ МЭДЭГДЛИЙГ ХҮРГҮҮЛЭХ ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЭЭГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ДААТГАЛЫН КОМПАНИ БОЛОН ТҮҮНИЙ ТӨЛӨӨЛӨГЧ МӨН АЛБАН ХААГЧИД ЯМАРВАА НЭГЭН ХУУЛИЙН ХАРИУЦЛАГА ХҮЛЭЭХГҮЙ.

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН


110 кВ-ын ЦДАШ-ын
ТЭГ ТЭНХЛЭГ ГАЗАР ДЭЭР БАЙГУУЛСАН АКТ

№22/1014

2022 он 10 Сар 14 өдөр

Улаанбаатар хот

1. Байршил: ----- Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, -----
2. Үндэслэсэн шийдвэр:-----№51с/2021/252 тоот (Техникийн нөхцөл)-----
3. Баригдах барилгын зориулалт: 110кВ-ын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
4. Захиалагч: ----- НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР-----
5. Гүйцэтгэгч: ----- “ЭНХ ӨГЛӨӨ” ХХК -----
6. Ерөнхий төлөвлөгөө хийсэн: ----- “-----” ХХК -----
7. Барилгын зураг зохиосон: ----- “МОН-ЭНЕРЖИ КОНСАЛТ” ХХК -----
8. Барилгын тэг тэнхлэг газарт шилжүүлсэн: ----- “ДОПЛЕР ИНЕРЦ” ХХК-----
9. Барилгын тэг тэнхлэг тавьсан багажны марк: ----- LEICA1230 GPS-----
10. Бэхэлсэн цэгийн тоо (гадасны тоо) ----- 36 ш -----
11. Эхлэлийн цэг авсан объект: -----
12. Тэг тэнхлэг тавьсан байдал (тэнхлэг) ----- Координатаар-----
13. Шалгасан арга, зөрүү: ----- Зай хэмжээ-----
14. Реперээс авсан өндрийн холболт ----- RTCM-Ref 0006 – WGS (UTM)
Y=641934.8185 X= 5308741.1601 H= 1324.5572 -----
15. Шалны түвшний өндөр: -----
16. Тэнхлэг шилжүүлэлт (хийсэн эсэх) ----- Үгүй-----

Хэмжилт хийсэн:

Геодизийн инженер:

 / Т. Энх-Амгалан /

Хянасан:

“Доплер Инерц” ХХК-ний
Захирал :

 / С Мөнхбат /

Шалгаж хүлээн авсан:

“ЭНХ ӨГЛӨӨ” ХХК

Ерөнхий инженер :

 / М. Мөнхтөр /

Жич: Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлсэн акт нь актны хавсралт, газрын гэрчилгээ, кадартын зураг, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө, батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний зай хэмжээ, өндөржилт, архитектор төлөвлөлтийн даалгавар, барилгажих талбайн байршлын смем зургын хамт хүчинтэй байна.

ХАВСРАЛТ

**М-Актны
Дугаар, нэр:**

Ажлын нэр:

Захиалагч:

Огноо:

Гүйцэтгэгч:

**Ажлын
тайлбар:**

**Ажлын
тайлбар:**

**Ажлын
тайлбар:**

**Ажлын
тайлбар:**

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**



ХАВСРАЛТ



**М-Актны
Дугаар, нэр:** Төмөр тулгуурын суурийг угсрах
ажлын журнал М15ж2-ЭХ

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар



Огноо: 10/23/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК

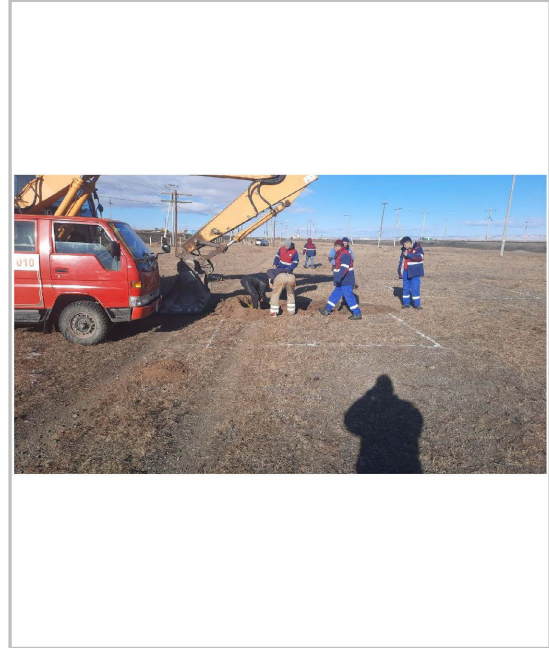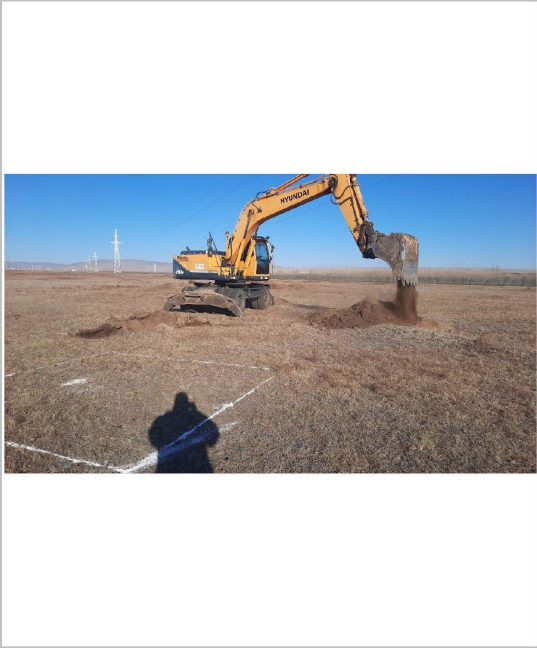

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
уух ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
уух ажил

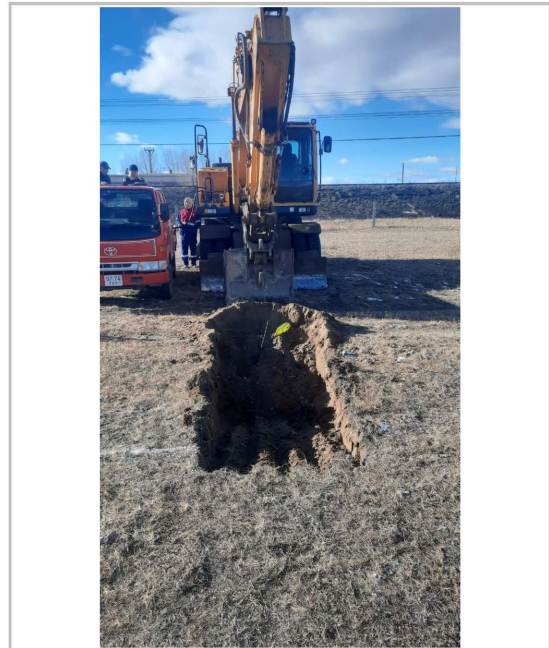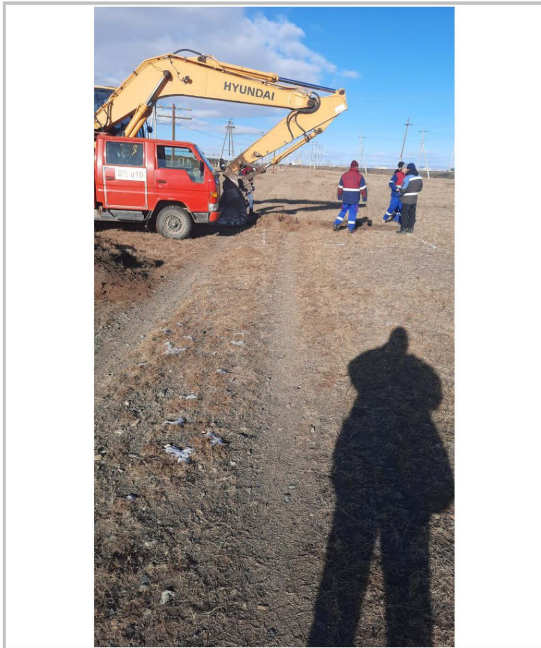

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх уух ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
уух ажил

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**

М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ

**М-Актны
Дугаар, нэр:**

Төмөр тулгуурын суурийг угсрах
ажлын журнал М15ж2-ЭХ

Ажлын нэр:

110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч:



Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар

Огноо:

10/25/2022



Гүйцэтгэгч:

"Энх-Өглөө"ХХК

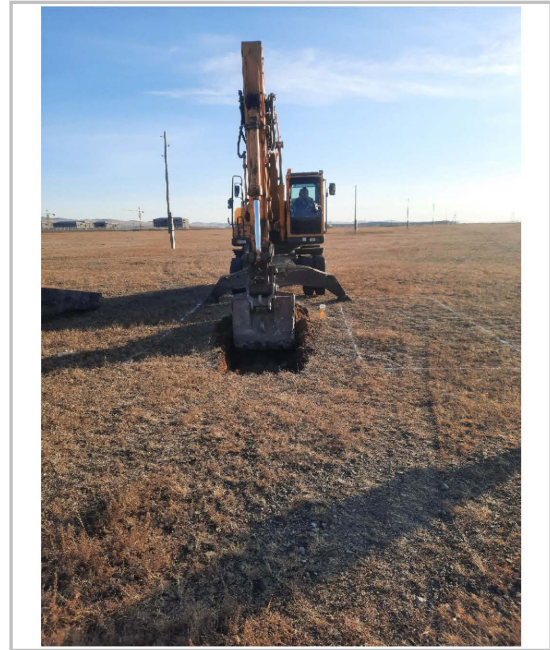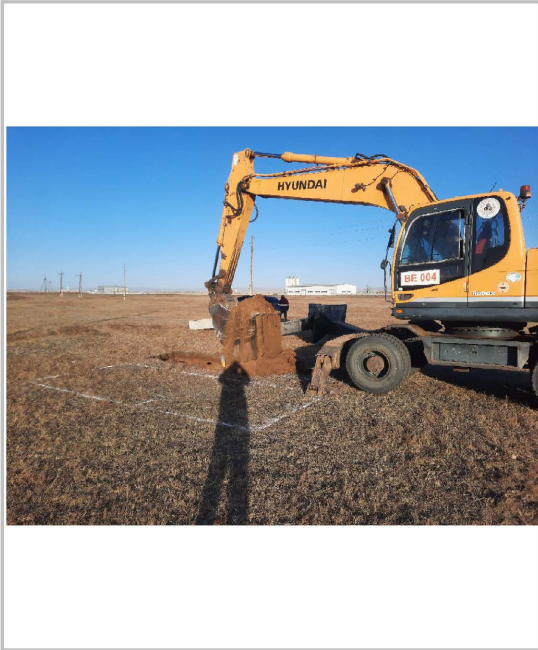

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
ухах ажил

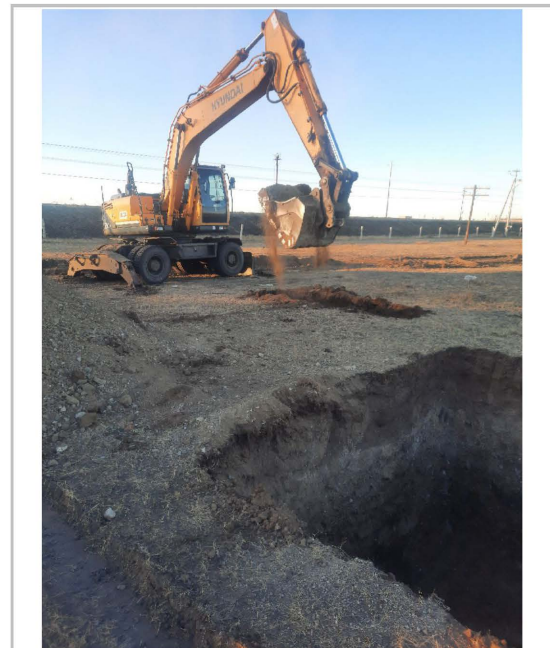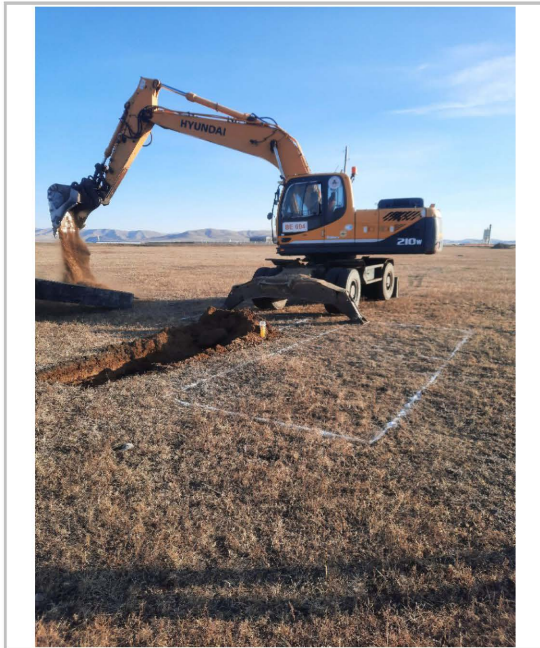

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф3-2 маягийн төмөр тулгуурын суурийн нүх
ухах ажил

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**

М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ



**М-Актны
Дугаар, нэр:** Төмөр тулгуурын суурийг угсрах
ажлын журнал М15ж2-ЭХ

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар


Огноо: 10/27/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК

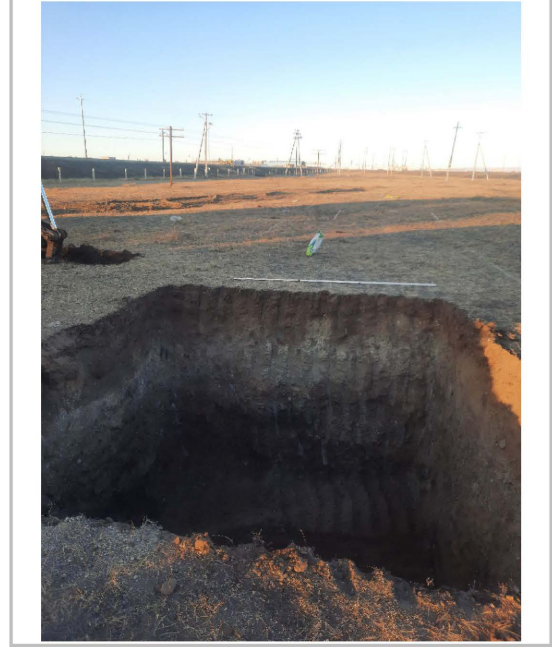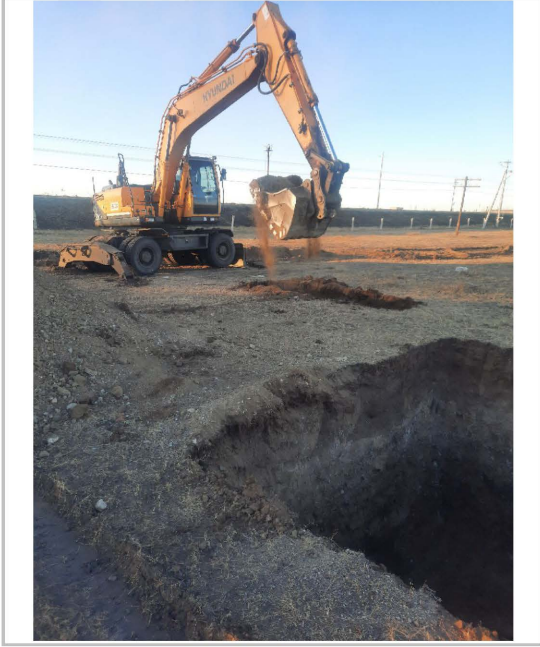

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

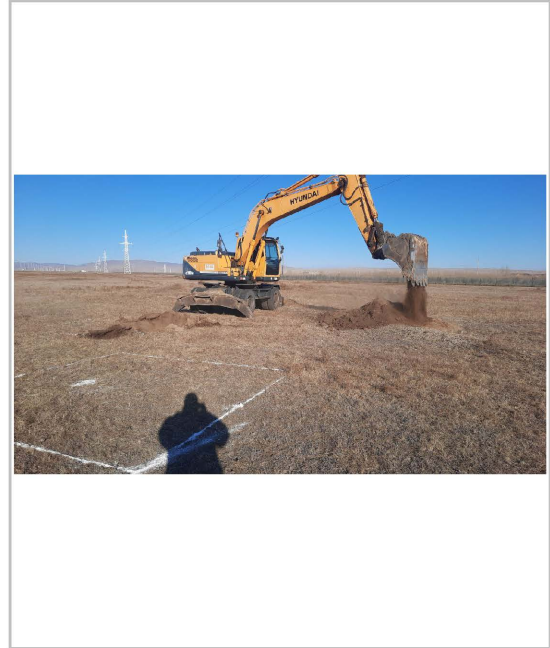

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**

М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ

**М-Актны
Дугаар, нэр:** Төмөр тулгуурын суурийг угсрах
ажлын журнал М15ж2-ЭХ

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар

Огноо: 10/31/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК



**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил



**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Ажлын
тайлбар:** Ф5-А маягийн төмөр тулгуурын суурийн
нүх ухах ажил

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**



М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ


**М-Актны
Дугаар, нэр:** Төмөр тулгуурын суурийг угсрах
ажлын журнал М15ж2-ЭХ

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар


Огноо: 10/28/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК

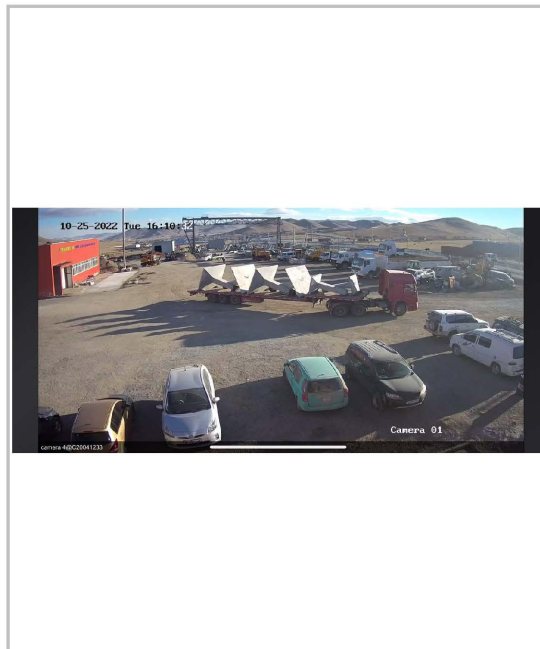

**Ажлын
тайлбар:** Төмөр тулгуурын суурь Ф3-2 тээвэрлэлт

**Ажлын
тайлбар:** Төмөр тулгуурын суурь Ф5-А, Ф3-2,

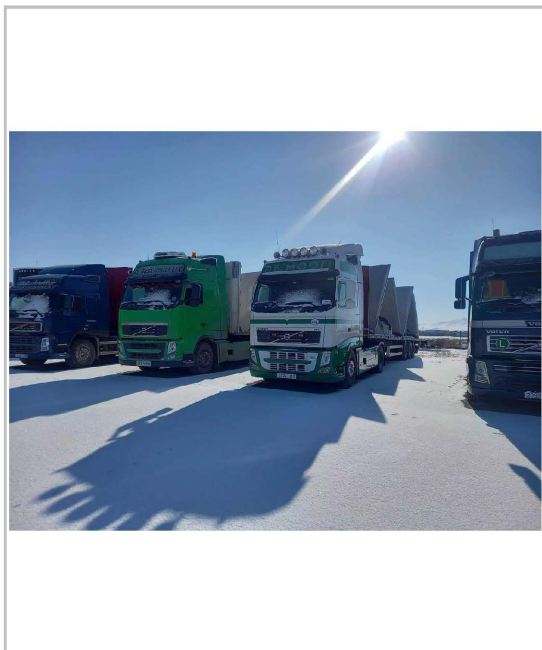

**Ажлын
тайлбар:** Төмөр тулгуурын суурь Ф5-А тээвэрлэлт

**Ажлын
тайлбар:** Төмөр тулгуурын суурь Ф5-А, тээвэрлэлт

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**



М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ


**М-Актны
Дугаар, нэр:** Үйлдвэрлэгдэж бэлэн болсон
бүтээгдэхүүн

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар



Огноо: 10/27/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК

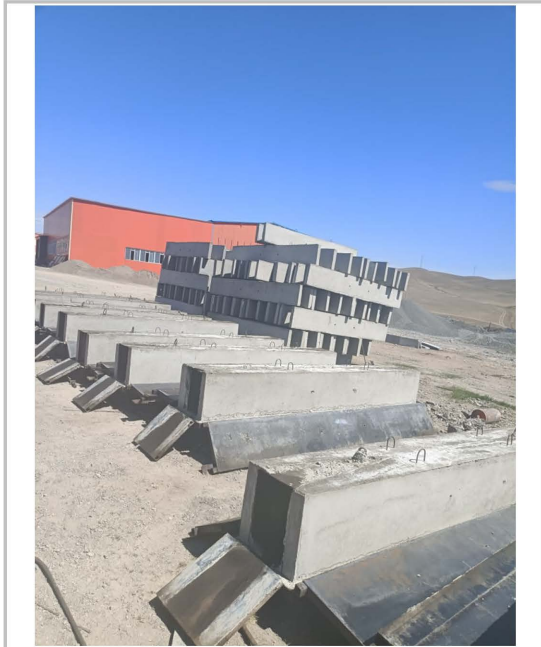

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Р1-А, АР-5
маягийн ригель

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф3-2, Ф5-А
маягийн төмөр тулгуурын суурь

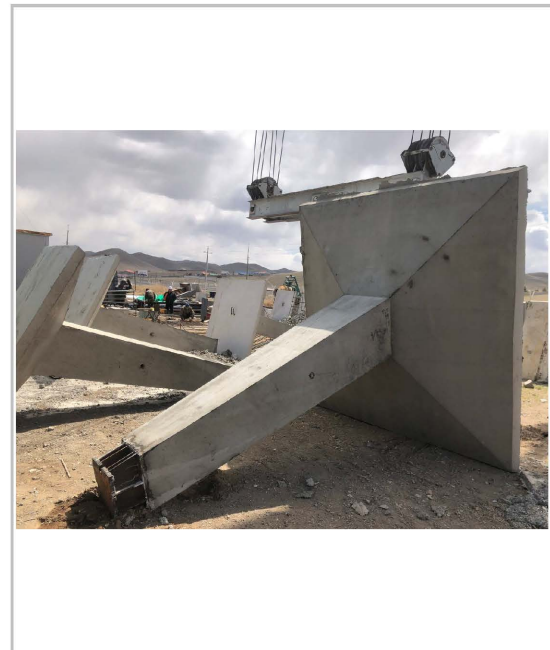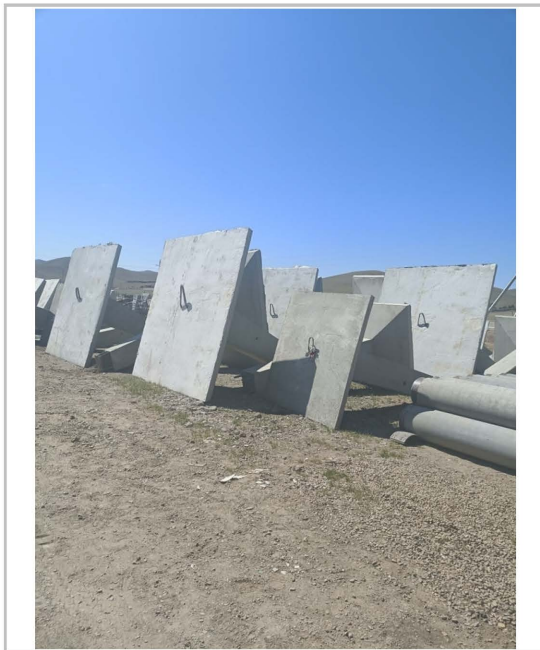

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурь

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурь

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Munkhtor'.

М.Мөнхтөр

ХАВСРАЛТ

**М-Актны
Дугаар, нэр:** Үйлдвэрлэгдэж бэлэн болсон
бүтээгдэхүүн

Ажлын нэр: 110кВ-ын ЦДАШ угсратын ажил

Захиалагч: Нийслэлийн Засаг Даргын
Тамгын Газар

Огноо: 10/27/2022

Гүйцэтгэгч: "Энх-Өглөө"ХХК



**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурийн бат бөх үзлэг

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурийн бат бөх үзлэг



**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурийн бат бөх үзлэг

**Ажлын
тайлбар:** Үйлвэрлэгдэж бэлэн болсон Ф5-А маягийн
төмөр тулгуурын суурийн бат бөх үзлэг

**Гүйцэтгэгчийн инженер:
Овог нэр, гарын үсэг**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Mönхтөр'.

М.Мөнхтөр



ЭНХ-ӨГЛӨӨ ХХК

ТӨМӨР БЕТОН ШОНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ БИЧИГ

ДУГААР ... **13/2022**
МӨРДӨГДӨХ СТАНДАРТ

B2.405.2-02.Д5-2004
ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН НЭР ХАЯГ **"ЭНХ ӨГЛӨӨ" ХХК**

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН НЭР ХАЯГ **"НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР"**

ШОНГИЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ **P1-A**

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ОГНОО **2022.10САР**

ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:

БЕТОНЫ МАРК /М / **B25**

ЭДЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ:

ЭЗЭЛХҮҮН / МЗ / **0,2**

ШОНГИЙН МАСС / ТН / **0,5**

ЧАНАР ШАЛГАГЧ **ЭНХ-ӨГЛӨӨ ХХК**



Утас: 976-11-321133
976-11-323377
Email: info@enkhugluu.mn



ЭНХ-ӨГЛӨӨ ХХК

ТӨМӨР БЕТОН ШОНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ БИЧИГ

ДУГААР... **23/2022**

МӨРДӨГДӨХ СТАНДАРТ

B2.405.2-02.Д5-2004

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН НЭР ХАЯГ
"ЭНХ ӨГЛӨӨ" ХХК

ХҮЛЭЭН АВАГЧИЙН НЭР ХАЯГ
**НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
ТАМГЫН ГАЗАР**

ШОНГИЙН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ **Ф5-А;**

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ОГНОО **2022.10 САР**

ЧАНАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:

БЕТОНЫ МАРК /М / **M400**

ЭДЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ:

ЭЗЭЛХҮҮН /МЗ / **2,5**

ШОНГИЙН МАСС/ТН / **6,2;**

ЧАНАР ШАЛГАГЧ
ЭНХ-ӨГЛӨӨ ХХК
ЛАНСХАТАГ ХОТ

Утас: 976-11-321133

976-11-323377

Email: info@enkhugluu.mn
